



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 032159138

Ref.: Ofício SGP-12 nº 217/2020

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento nº 60/2020, de autoria da Vereadora Soninha Francine, aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho a essa Presidência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal da Saúde a respeito do Projeto de Reestruturação e Requalificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

IVAN TEIXEIRA DA COSTA BUDINSKI

Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

EDUARDO TUMA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Ivan Teixeira da Costa Budinski, Chefe de Gabinete**, em 26/08/2020, às 18:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032159138** e o código CRC **C257DB49**.



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avança Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Contrato: 102/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Jd. Colonial Valor Contrato: R1.766.660,10 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 109/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Rio Claro Valor Contrato: R2.129.638,45 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 99/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Jd. Colorado Valor Contrato: R1.573.899,03 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 101/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Vila Cupecê Valor Contrato: R2.231.107,54 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Código Engenharia e Construções Ltda Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 103/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Jd. Ladeira Rosa Valor Contrato: R1.993.350,44 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: MAS Construções e Empreendimentos LTDA. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 110/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Nanci Abranches - Caxingui Valor Contrato: R907.931,18 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: EEC Engenharia e Construções LTDA. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 089/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Vila Paranaguá Valor Contrato: R2.133.195,43 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avançar Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Contrato: 094/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma AMA/UBS Integrada Anhanguera I Valor Contrato: R2.033.002,51 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 097/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma AMA/UBS Integrada Castro Alves Valor Contrato: R1.589.246,19 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 075/2020-SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Primeiro de Outubro Valor Contrato: R1.663.251,74 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 077/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Cidade Kemel Valor Contrato: R1.507.206,01 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 078/2020/SMS=1 Descritivo: Reforma AMA/UBS Integrada Jardim das Oliveiras Valor Contrato: R1.696.939,82 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 081/2020 Descritivo: Prestação de serviços de assessoria técnica de apoio à fiscalização de obras, elaboração de projetos e revisão de projetos tipológicos. Valor Contrato: R20.981.306,87 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: CONSÓRCIO SGS ENGER - CAA Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avança Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Contrato: 73/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma AMA/UBS Integrada Massagista Mario Américo - Sítio Mandaqui Valor Contrato: R1.575.726,83 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 74/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Dr. Sigmund Freud - Indianópolis Valor Contrato: R1.092.337,13 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: MAS Construções e Empreendimentos LTDA. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 076/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma AMA/UBS Integrada Jardim Paulistano Valor Contrato: R1.338.234,12 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Saned Engenharia e Empreendimentos S.A. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 070/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Adelaide Lopes Valor Contrato: R1.763.034,45 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TERRANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 067/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Veleiros Valor Contrato: R1.523.895,56 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 062/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma Pq. Novo Mundo II Valor Contrato: R1.016.593,62 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: E.C.G ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 066/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Jd. São Pedro Valor Contrato: R1.533.200,58 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 069/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Bom Retiro Valor Contrato: R682.847,00	Fornecedor: JLA Construções e Comércio Eireli Valor Pago: R0,00	Situação: Em Andamento



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avança Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Avanço Físico: 0,00 %

Avanço Financeiro: 0,00 %



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avança Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Contrato: 068/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma AMA/UBS Vila Santa Catarina Valor Contrato: R769.952,20 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 % Situação: Em Andamento
Contrato: 072/2020/SMS-1 Descritivo: Contratação de empresa especializada para a implantação de PLATAFORMA DE TELEMEDICINA com instrumentalização para as suas funcionalidades, incluindo a Integração Valor Contrato: R32.283.073,19 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA Valor Pago: R3.426.990,75 Avanço Financeiro: 10,62 % Situação: Em Andamento
Contrato: 064/2020/SMS-1 Descritivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EXISTENTES, VISANDO IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CADA COM UM MÓDULO AUTÔNOMO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ÂMBITO DO PROJETO MUNICIPAL SAÚDE DA CIDADANIA Valor Contrato: R8.296.177,00 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 % Situação: Em Andamento
Contrato: 017/SIURB/20 Descritivo: UPA Mooca Valor Contrato: R4.595.286,03 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 % Situação: Em Andamento
Contrato: 002/2020-SMS.G/AHM Descritivo: Aquisição de equipamentos para possibilitar serviços de saúde de 150 leitos de terapia intensiva adulto e 30 leitos de internação clínica no Hospital Municipal Vila Brasilândia Valor Contrato: R15.000.000,00 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: IABAS - INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA DE SAÚDE Valor Pago: R15.000.000,00 Avanço Financeiro: 100,00 % Situação: Em Andamento
Contrato: 058/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Jd. Guanabara Valor Contrato: R1.821.819,22 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Enotec Engenharia Obras e Tecnologia Ltda Valor Pago: R62.062,30 Avanço Financeiro: 3,41 % Situação: Em Andamento
Contrato: 052/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Vila Praia Valor Contrato: R1.022.347,77 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: B&B Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R65.440,59 Avanço Financeiro: 6,40 % Situação: Em Andamento
Contrato: 049/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Nossa Sra Aparecida Valor Contrato: R1.696.087,16	Fornecedor: G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA Valor Pago: R80.185,42 Situação: Em Andamento



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avança Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Avanço Físico: 0,00 %

Avanço Financeiro: 4,73 %



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avança Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Contrato: 048/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Vila Jacuí Valor Contrato: R1.639.509,45 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor Pago: R34.712,45 Avanço Financeiro: 2,12 % Situação: Em Andamento
Contrato: 051/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma AMA/UBS Burgo Paulista Valor Contrato: R1.728.533,81 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Saned Engenharia e Empreendimentos S.A. Valor Pago: R30.926,88 Avanço Financeiro: 1,79 % Situação: Em Andamento
Contrato: 016/SIURB/20 Descritivo: Construção UPA Parelheiros Valor Contrato: R4.719.939,61 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 % Situação: Em Andamento
Contrato: 018/SIURB/20 Descritivo: Construção UPA Jabaquara Valor Contrato: R4.695.606,62 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP Valor Pago: R0,00 Avanço Financeiro: 0,00 % Situação: Em Andamento
Contrato: 045/2020/SMS-1 Descritivo: 1_1_16 - Reforma UBS Wamberto Dias da Costa Valor Contrato: R1.739.053,37 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R362.301,16 Avanço Financeiro: 20,83 % Situação: Em Andamento
Contrato: 021/2020/SMS1 Descritivo: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DE MENOR PORTE, PARA DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE REFORMA DE MENOR PORTE Valor Contrato: R770.733,68 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: GLIZT & CARVALHO ENGENHARIA Valor Pago: R203.422,41 Avanço Financeiro: 26,39 % Situação: Em Andamento
Contrato: 044/2020/SMS-1 Descritivo: Consultoria para prestação de serviços especializados para desenvolvimento de ações de sustentabilidade no âmbito do projeto de reestruturação e qualificação das redes Valor Contrato: R794.681,03 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: NATURAL HABITAT LTDA Valor Pago: R18.687,96 Avanço Financeiro: 2,35 % Situação: Em Andamento
Contrato: 038/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Jd. Roseli Valor Contrato: R1.704.158,02	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R174.909,65 Situação: Em Andamento



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avança Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Avanço Físico: 0,00 %

Avanço Financeiro: 10,26 %



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avançar Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Contrato: 039/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS/AMA Integrada Pari Valor Contrato: R1.731.025,01 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R266.239,39 Avanço Financeiro: 15,38 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 034/2019/SMS-1 Descritivo: 01.08.13 - Reforma - UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre Valor Contrato: R987.698,16 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: MAS Construções e Empreendimentos LTDA. Valor Pago: R87.362,35 Avanço Financeiro: 8,84 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 035/2020/SMS-1 Descritivo: 01.08.03 - Reforma UBS VI. Zatt Valor Contrato: R1.709.864,24 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R536.017,98 Avanço Financeiro: 31,35 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 036/2020/SMS-1 Descritivo: 01.08.11 - Reforma UBS Humaitá Valor Contrato: R1.607.217,00 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R383.180,70 Avanço Financeiro: 23,84 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 033/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Vila Palmeiras Valor Contrato: R853.342,68 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R161.451,19 Avanço Financeiro: 18,92 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 030/2020/SMS-1 Descritivo: 01.08.08 - Reforma - UBS Manuel Joaquim Pera Valor Contrato: R520.986,75 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: EEC Engenharia e Construções LTDA. Valor Pago: R135.971,73 Avanço Financeiro: 26,10 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 027/2020 Descritivo: Contratação de consultor individual para apoio à Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) na área de engenharia e planejamento de obras no âmbito do projeto de Valor Contrato: R261.756,00 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TCH CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA Valor Pago: R77.799,70 Avanço Financeiro: 29,72 %	Situação: Em Andamento
Contrato: 024/2020/SMS-1 Descritivo: 01.08.05 - Reforma da UBS Jardim Vera Cruz Valor Contrato: R1.433.432,03	Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA Valor Pago: R150.495,01	Situação: Em Andamento



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avança Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Avanço Físico: 0,00 %

Avanço Financeiro: 10,50 %



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avança Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Contrato: 023/2020/SMS-1 Descritivo: 01.08.01 - Reforma UBS Pq. Anhanguera Valor Contrato: R1.647.707,70 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA Valor Pago: R891.627,13 Avanço Financeiro: 54,11 % Situação: Em Andamento
Contrato: 022/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma - UBS Cid. Pedro José Nunes Valor Contrato: R1.557.475,80 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor Pago: R766.047,18 Avanço Financeiro: 49,19 % Situação: Em Andamento
Contrato: 020/2020/SMS-1 Descritivo: Prestação de serviços especializados de assessoria técnica administrativos financeira de gerenciamento e monitoramento e avaliação para apoio à Unidade de Coordenação do Valor Contrato: R19.100.067,17 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: PROINTEC & PBLM Valor Pago: R1.570.400,63 Avanço Financeiro: 8,22 % Situação: Em Andamento
Contrato: 026/2020/SMS-1 Descritivo: Contratação direta de consultoria para prestação de serviços especializados na área financeira. Valor Contrato: R261.756,00 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Scarpicosta Consultoria e Planejamento Corporativo LTDA Valor Pago: R87.252,00 Avanço Financeiro: 33,33 % Situação: Em Andamento
Contrato: 01.07.12 Descritivo: 01_07_12 - Reforma do Pronto Socorro do Hospital do Servidor Publico Municipal Valor Contrato: R9.196.354,39 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP Valor Pago: R5.268.104,41 Avanço Financeiro: 57,28 % Situação: Em Andamento
Contrato: 001/2018 NTCSS/SMS.G Descritivo: 01_10_01 - Instalação de equipamento no Hospital Parelheiros através de Contrato de Gestão pela organização social SPDM Valor Contrato: R40.215.365,76 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Valor Pago: R38.746.626,64 Avanço Financeiro: 96,35 % Situação: Concluído
Contrato: 024/SIURB/15 Descritivo: Construção do Hospital da Brasilândia. Valor Contrato: R246.040.636,02 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Consórcio HM Brasilândia Valor Pago: R163.914.047,38 Avanço Financeiro: 66,62 % Situação: Em Andamento
Contrato: 088/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Jardim Marcelo Valor Contrato: R\$. 2.097.006,12	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R0,00 Situação: Em Andamento



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avança Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Avanço Físico: 0,00 %

Avanço Financeiro: 0



Empréstimo : 3276/OC-BR

12/08/2020

Mutuário : Município de São Paulo

Programa : Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais - Avançar Saúde

Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro dos Contratos

Contrato: 091/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Geraldo da Silva Ferreira Valor Contrato: R\$. 2.058.243,15 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TERRANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Situação: Em Andamento Avanço Financeiro: 0
Contrato: 090/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Chácara Santo Antonio Valor Contrato: R\$. 1.779.235,86 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TERRANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Situação: Em Andamento Avanço Financeiro: 0
Contrato: 087/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Casa Verde Valor Contrato: R\$. 1.584.025,66 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Situação: Em Andamento Avanço Financeiro: 0
Contrato: 085/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Vila Regina Valor Contrato: R\$. 1.695.597,20 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R0,00 Situação: Em Andamento Avanço Financeiro: 0
Contrato: 095/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Jardim Panamericano Valor Contrato: R\$. 1.492.680,43 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: TETRA-BASE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor Pago: R0,00 Situação: Em Andamento Avanço Financeiro: 0
Contrato: 092/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma Complexo Peri-Peri Valor Contrato: R\$. 1.923.284,56 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: B&B Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R0,00 Situação: Em Andamento Avanço Financeiro: 0
Contrato: 096/2020/SMS-1 Descritivo: Reforma UBS Itaquera Valor Contrato: R\$. 2.203.562,25 Avanço Físico: 0,00 %	Fornecedor: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda. Valor Pago: R0,00 Situação: Em Andamento Avanço Financeiro: 0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Núcleo Unidade de Coordenação do Projeto - UCP

Rua General Jardim 36, 9º andar - São Paulo/SP - CEP 01223-010

Telefone:

Encaminhamento SMS/UCP Nº 031994838

São Paulo, 12 de agosto de 2020.

SMS/G - ASSESSORIA PARLAMENTAR

Sr. Coordenador,

Em atendimento ao solicitado SEI 031708851, encaminhamos Relatório de Aquisições, contendo os contratos firmados pelo Projeto Avança Saúde SP - BID, SEI 031994718, bem como cópia da apresentação SEI 031994771.

Assim sendo, encaminhamos o presente para conhecimento e providências subsequentes cabíveis.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Emmanuel Schmidi Oliveira, Assessor(a) II**, em 12/08/2020, às 19:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031994838** e o código CRC **8DBC5A44**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Chefia de Gabinete

Rua General Jardim, 36, 2.º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-906

Telefone:

Encaminhamento SMS/CG Nº 032138114

São Paulo, 17 de agosto de 2020.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo / Comissão de Finanças e Orçamento / Vereadora Soninha Francine

Assunto: Requerimento nº 60/2020, solicitando informações a respeito do Programa de Reestruturação e Requalificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo.

PREF/CASA CIVIL/ATL II,

Com nossos cordiais cumprimentos, tendo em vista o quanto solicitado no presente, originado do Legislativo, com a finalidade de oferta de informações nos termos requeridos no ofício SGP- nº 217/2020, doc. **(031482982)**, restituímos o presente com as informações prestadas pelas áreas técnicas correspondentes dentro da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde **(031994718 - 031994771 - 031994838)**.

No mais, colocamo-nos inteiramente à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Armando Palmieri

Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Armando Luis Palmieri, Chefe de Gabinete**, em 17/08/2020, às 18:41, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032138114** e o código CRC **CF48AED9**.



São Paulo, 29 de julho de 2020.

OFICIO SGP12 n. 217/2020

Senhor Prefeito,

Em atenção ao requerido pela Douta Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do art. 46, incisos VIII e XIII do Regimento Interno desta Edilidade e dos art. 32, § 2º, inciso III, e 70, inciso V, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, encaminho a Vossa Excelência o **Requerimento FIN nº 60/2020** de autoria da **Vereadora Soninha Francine**, aprovado na reunião da referida Comissão em 29/07/2020, no qual solicita informações a **Secretária Municipal da Saúde**.

Na oportunidade, renovo meus votos de distinta consideração, colocando ao seu dispor, para as informações que julgue oportunas, a Secretaria da Comissão.

Atenciosamente,

EDUARDO TUMA
Presidente

À Sua Excelência, o Senhor
BRUNO COVAS
Prefeito da Cidade de São Paulo
CEP 01415-001 - São Paulo - SP
Tel.: 3113-8000
E-mail: prefeito@prefeitura.sp.gov.br

Este documento contém assinatura digital



REQUERIMENTO FIN Nº 60/2020

REQUEIRO, na forma regimental, que a Secretaria Municipal da Saúde envie a esta Comissão informações referentes ao andamento do Programa de Reestruturação e Requalificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo (Avança Saúde SP).

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 29/07/2020.

Soninha Francine
Vereadora – Cidadania

PROJETO AVANÇA SAÚDE

STATUS DAS AÇÕES DO PROJETO



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE




Banco Interamericano
de Desenvolvimento



Projeto Avança Saúde São Paulo


Contrapartida

■ Saldo Orçamento ■ Saldo dos Contratos ■ Liquidado

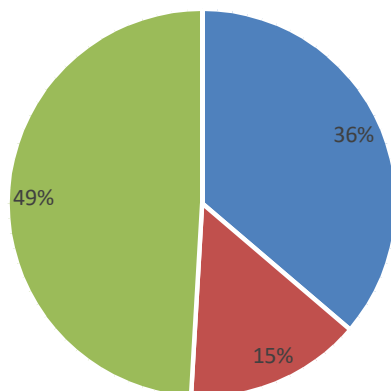

BID

■ Saldo Orçamento ■ Saldo dos Contratos ■ Liquidado

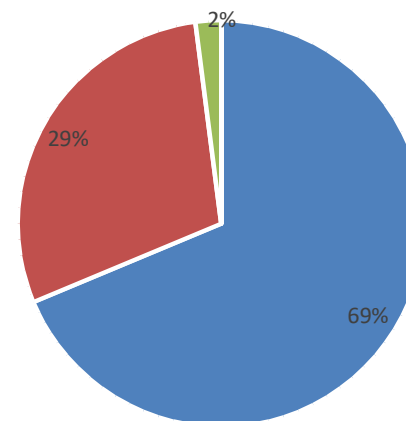

Posição em 31/07

prefeitura.sp.gov.br/saude

saudeprefsp



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

Projeto Avança Saúde São Paulo

Taxa: R\$ 4,6385/US\$

	CONTATO EMPRÉSTIMO		Contratado (até 31/07)		Liquidado (até 31/07)	
	BID	LOCAL	BID	LOCAL	BID	LOCAL
01. Apoio à reestruturação, reorganização e integração das redes locais de atenção à saúde	63.811.000,00	98.288.000,00	19.937.854,58	63.621.727,92	916.374,94	49.059.116,75
02. Melhoria da eficiência e da qualidade do sistema de saúde	22.329.000,00		171.322,85		4.028,88	
02A. Instrumentos para ampliar as capacidades institucionais da SMS	12.832.000,00		171.322,85		4.028,88	
02B. Melhoria contínua da produtividade interna e da qualidade do setor de saúde	9.497.000,00	1.712.000,00				
03. Fortalecimento da gestão da informação e incentivo à inovação e ao uso de novas tecnologias em saúde	7.400.000,00		6.959.808,82		738.814,43	
04. Administração e Avaliação do Projeto	6.460.000,00		4.230.587,31		374.140,86	
TOTAL	100.000.000,00	100.000.000,00	31.299.573,55	63.621.727,92	2.033.359,11	49.059.116,75
