



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 11 de junho de 2015.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. I. L. nº 288/15-C

Ref.: Ofícios SGP-23 nº 577/2015 e nº 578/2015

DOCREC

514/2015

Senhor Presidente

Reportando-me aos ofícios acima referenciados, em atenção aos Requerimentos RDS nº 416/2005 e nº 417/2015, formulados pelo Vereador Andrea Matarazzo, encaminho a Vossa Excelência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Cultura relativamente à construção, requalificação ou reforma de equipamentos culturais e ao calendário anual de programação cultural.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO MACENA DA SILVA
Secretário do Governo Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO DONATO

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

JAM/MMO/drs
Req RDS 416 e 417-15

0159 - SGP-22 - 12/06/2015 - 15:53 - 000233 - 1/1

ACOMPANHA OFÍCIO ATL Nº 288/2015 - C
Req RDS 416 e 417-15

M E T A 27 Construir, requalificar ou reformar 16 equipamentos culturais

CULTURA

Secretaria Municipal de Cultura

Projetos desta meta Receber notificações

Requalificação dos Teatros Paulo Eiró, Arthur Azevedo e Flávio Império concluídas, além dos equipamentos Casa do Bandeirante, Torre da Memória e Edifício Ramos de Azevedo.

EM ANDAMENTO
COM BENEFÍCIOS
À POPULAÇÃO

53,6%

As intervenções contemplaram desde requalificações das instalações prediais, fiação elétrica, instalações técnicas, ampliações físicas e de capacidade, até melhoria da segurança dos funcionários, artistas e público, adequação da acessibilidade, restauração de patrimônio histórico e paisagística, com destaque para a construção de edifício anexo ao Teatro Arthur Azevedo onde será instalado o Clube do Choro, escola de música dedicada ao ensino do Chorinho.

Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

11.08
08/06/2015

201501063282

M E T A

27

Construir, requalificar ou
reformular 16
equipamentos culturais

CULTURA

Secretaria Municipal de Cultura

Resumo
desta meta

Receber
notificações

Casa de Cultura Casarão Celso Garcia
Equipamento cultural - Sacolão das Artes
Biblioteca Cora Coralina
Equipamento cultural - Edifício da Antiga
Sociedade Philarmônica Alemã Lyra
Casa de Cultura de São Mateus
Casa de Cultura do Sítio Mirim
Teatro Flávio Império
Biblioteca Rubens Borba de Moraes
Biblioteca Érico Veríssimo
Biblioteca Mário de Andrade
Praça das Artes
Centro cultural São Paulo
Casa de Cultura Palhaço Carequinha
Biblioteca Vinícius de Moraes
Torre da Memória

Biblioteca Camila Cerqueira César
Casa de Cultura de Ermelino Matarazzo
Casa de Cultura de Jabaquara
Casa de Cultura de Parelheiros
Casa de Cultura de Pirituba
Casa de Cultura da Vila Guilherme
Teatro Arthur Azevedo
Teatro Paulo Eiró
Biblioteca Thales Castanho de Andrade
Biblioteca Castro Alves
Praça do Circo
Edifício Sampaio Moreira
Tendal da Lapa
Casa do Bandeirante
Centro Cultural da Juventude
Edifício Ramos de Azevedo

201501063282

11.09
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Casa de Cultura Casarão Celso Garcia

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Mooca	Mooca	10,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍD

2015-10-3292

08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Restauro de um antigo Casarão da cidade de São Paulo, localizado na Avenida Celso Garcia e que integra uma Zona Especial de Preservação Cultural (ZPEC). O

Casarão será um equipamento cultural, apto a desempenhar um papel destacado na região em que está inserido, caracterizada pela baixa concentração de equipamentos públicos de cultura e lazer.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	R\$ 129.000,00	Sem execução orçamentária no ano	

201501063202

11.11
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Equipamento cultural - Sacolão das Artes

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO
Equipamentos readequados	M ^o Boi Mirim	Capão Redondo

EM ANDAMENTO

10,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)
------------------------------	--	-------------------------

Obras de readequação (45%)

Implantação de estrutura (25%)

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

20150.1063282

11.12
10/10/2015
Ailton Marinho - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Construção de edifício público projetado para abrigar uma UBS e um equipamento de cultura, em região com grande demanda por atividades culturais, cujo compartilhamento irá permitir a realização de ações conjuntas entre as Secretarias de Saúde e Cultura.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

Artur Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

11.13
08/06/2015

Biblioteca Cora Coralina

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO
Equipamentos readequados	Guaianases	Guaianases

EM ANDAMENTO

52,5%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.14
12/06/2015
Ailton Wilson
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Reforma, adequação e preservação do patrimônio público, visando proporcionar maior eficiência de atendimento, conforto e segurança aos frequentadores da biblioteca.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	R\$ 169.000,00	R\$ 132.344,00	

201501063282

Pl. 15
08/06/2015
Ailton Marinho - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Equipamento cultural - Edifício da Antiga Sociedade Philarmônica Alemã Lyra

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Sé	Distrito	5,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

Handwritten signature
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Imóvel antigo localizado na Rua São Joaquim, antiga sede da Sociedade Phylarmônica Alemã Lyra, atualmente objeto de estudos com o propósito de instalação de equipamento cultural.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

Pl.17
28/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Casa de Cultura de São Mateus

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	NÃO INICIADA
Equipamentos readequados	São Mateus	Distrito	0,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Radequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
FASE NÃO INICIADA	FASE EM ANDAMENTO	FASE CONCLUÍDA		

201501063882

[Signature]
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Em fase de estudos para elaboração do projeto básico.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063262

Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

08/06/2015

Casa de Cultura do Sítio Mirim

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	São Miguel	Vila Jacuí	15,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063262

Pl. 20
28/06/2015
Ailton Miranda - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Projeto de construção de equipamento cultural em área preservada e da estrutura de proteção e preservação da ruína arqueológica existente no local.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

Pl. 21
Artur Maridngon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Teatro Flávio Império

TIPO

Equipamentos
readequados

SUBPREFEITURA

Penha

DISTRITO

Cangaíba

CONCLUÍDO

100,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de
Readequação
(10%)

Garantia da
fonte de
financiamento
(10%)

Licitação da
obra (10%)

Obras de readequação (45%)

Implantação de estrutura (25%)

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.22
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Teatro com capacidade para 211 espectadores e instalações adequadas para a apresentação de espetáculos cênicos, com conforto e acessibilidade.

Possui auditório externo com acentos para 100 frequentadores e palco reversível para apresentações ao ar livre no parque onde foram implantados projetos de paisagismo e lazer.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	R\$ 2.280.650,00	R\$ 1.108.759,00	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

R.23
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Biblioteca Rubens Borba de Moraes

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Ermelino Matarazzo	Distrito	20,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA

291501063282

11.24
28/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Obras de requalificação e conservação predial.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

fl. 25
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Biblioteca Érico Veríssimo

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Pirituba	Jaraguá	15,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.26
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Obras de requalificação e conservação predial e
implantação de horta pedagógica e leitura.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

Pl. 27
Ailton Waringon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - CAB

Biblioteca Mário de Andrade

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Sé	República	20,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Reforma de adaptação predial para instalação de unidade de digitalização do acervo da biblioteca e a construção de uma plataforma que permitirá a publicação digitalizada de todos os periódicos do País.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

11.29
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Praça das Artes

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Sé		25,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.30
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Obras para execução da segunda fase de construção
do complexo Praça das Artes.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

Pl. 31
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Centro cultural São Paulo

TIPO

Equipamentos
readequados

SUBPREFEITURA

Vila Mariana

DISTRITO

EM ANDAMENTO

15,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de
Readequação
(10%)

Garantia da
fonte de
financiamento
(10%)

Licitação da
obra (10%)

Obras de readequação (45%)

Implantação de estrutura (25%)

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.32
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Conservação do patrimônio público e adequação do espaço para permitir melhor circulação dos frequentadores e reforma das fachadas que dão frente para a Avenida 23 de maio.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

Pl. 33
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Casa de Cultura Palhaço Carequinha

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	NÃO INICIADA
Equipamentos readequados	Capela do Socorro		0,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

fl. 34
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Em fase de estudos para elaboração do projeto básico
de requalificação do equipamento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

11.35
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Biblioteca Vinícius de Moraes

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Itaquera		52,5%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.36

08/06/2015

Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Reforma, adequação e preservação do patrimônio público, para receber o acervo da Biblioteca Vicente de Carvalho e proporcionar maior eficiência de atendimento, conforto e segurança aos frequentadores da biblioteca.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	R\$ 48.500,00	

Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

11.37
08/06/2015

201501063282

Torre da Memória

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	CONCLUÍDO
Equipamentos readequados	Sé	Sé	100,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

Pl. 38
08/06/2015
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Edifício anexo ao Arquivo Histórico Municipal (Edifício Ramos de Azevedo), abriga a área técnica-administrativa e incorpora a guarda de documentos históricos da Prefeitura Municipal de São Paulo. O espaço também é utilizado para pesquisas, realização de exposições e oficinas de capacitação.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	R\$ 1.007.986,00	R\$ 299.217,00	Sem execução orçamentária no ano	

201501063882

11.39
04/06/2015
Aurion Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Biblioteca Camila Cerqueira César

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Butantã	Butantã	52,5%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA

201501063282 - 11.40
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Reforma, adequação e preservação do patrimônio público, visando proporcionar maior eficiência de atendimento, conforto e segurança aos frequentadores da biblioteca.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	R\$ 126.433,00	R\$ 265.700,00	

201501063282

Pl. 41
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Casa de Cultura de Ermelino Matarazzo

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO
Equipamentos readequados	Ermelino Matarazzo	Ermelino Matarazzo

EM ANDAMENTO

20,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)
------------------------------------	---	----------------------------

Obras de readequação (45%)

Implantação de estrutura (25%)

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.42
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Construção da Casa de Cultura em atendimento à
demanda por equipamentos culturais na região.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	R\$ 185.000,00	

201501063282

Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Pl. 43
04/06/2015

Casa de Cultura de Jabaquara

TIPO

Equipamentos
readequados

SUBPREFEITURA

Jabaquara

DISTRITO

Distrito

EM ANDAMENTO

5,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de
Readequação
(10%)

Garantia da
fonte de
financiamento
(10%)

Licitação da
obra (10%)

Obras de readequação (45%)

Implantação de estrutura (25%)

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

Handwritten signature
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB
08/06/2015

ANDAMENTO QUALITATIVO

Obras e projetos executivos de acessibilidade e
conservação de equipamento cultural que abriga a
Biblioteca Paulo Duarte.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

fl. 45
10/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Casa de Cultura de Parelheiros

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	NÃO INICIADA
Equipamentos readequados	Parelheiros	Distrito	0,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA

201501063282

fl. 46
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Em fase de estudos para elaboração do projeto básico.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

Alton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB
09/06/2015
H.47

Casa de Cultura de Pirituba

TIPO

Equipamentos
readequados

SUBPREFEITURA

Pirituba

DISTRITO

São Domingos

EM ANDAMENTO

15,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de
Readequação
(10%)

Garantia da
fonte de
financiamento
(10%)

Licitação da
obra (10%)

Obras de readequação (45%)

Implantação de estrutura (25%)

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.48
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Em fase de estudos para elaboração do projeto básico.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

11.49
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Casa de Cultura da Vila Guilherme

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Vila Maria/Vila Guilherme	Distrito	5,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA

2015010632827
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB
08/06/2015

ANDAMENTO QUALITATIVO

Em fase de estudos para elaboração do projeto básico.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063382

11.51
08/06/2015
Aircy Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAR

Teatro Arthur Azevedo

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	CONCLUÍDO
Equipamentos readequados	Mooca	Mooca	100,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Radequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
-----------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.52
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

As intervenções resultaram na ampliação do teatro com capacidade para 376 espectadores, instalações adequadas para a apresentação de espetáculos cênicos, com conforto, segurança e fácil acessibilidade aos frequentadores. A ampliação inclui a construção de edifício anexo onde será instalado O Clube do Choro, escola de música dedicada ao ensino do Chorinho.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	R\$ 3.709.646,00	R\$ 2.891.413,00	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

11.53
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Teatro Paulo Eiró

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	CONCLUÍDO
Equipamentos readequados	Santo Amaro	Santo Amaro	100,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.54
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

As intervenções contemplaram a requalificação das instalações prediais do teatro com capacidade para 468 espectadores, das instalações técnicas com a remodelação da caixa cênica, novos camarins e reativação do elevador do fosso de orquestra. A instalação de equipamento de ar condicionado e a acessibilidade fácil conferem conforto e segurança aos frequentadores. A praça em que se localiza recebeu novo paisagismo e foi totalmente reformada

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	R\$ 2.191.548,00	R\$ 5.101.261,00	Sem execução orçamentária no ano	


Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

201501063282

11.55
08/06/2015

Biblioteca Thales Castanho de Andrade

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Freguesia/Brasilândia	Freguesia do Ó	5,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.576
10/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Biblioteca Castro Alves

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Ipiranga	Ipiranga	10,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Readequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

11.57
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAR

ANDAMENTO QUALITATIVO

Obras de requalificação e conservação predial.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282



Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAP

Pl. 58
08/06/2015

Praça do Circo

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Construção de equipamento	Em definição		15,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Definição de Terreno (10%)	Projeto Básico (5%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licenciamento obra (5%)	Licitação da obra (10%)	Obras - Fase 1 (20%)	Obras - Fase 2 (35%)	Estruturação para funcionamento (5%)
----------------------------	---------------------	--	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA

201501063282

Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB
08/06/2015
R. 59

ANDAMENTO QUALITATIVO

Construção de espaço permanente com infra-estrutura necessária para montagem e instalação de companhias circenses.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282

Assessoria de Planejamento
SMC - GAB
Ailton Marangon - AGPP
08/06/2015
JL. 60

Edifício Sampaio Moreira

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Sé		60,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Radequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
-----------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA

201701063282

Al. 61
07/06/2015

Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Construído em 1924 o Edifício Sampaio Moreira, é considerado o primeiro "arranha-céu" da cidade de São Paulo, e sua estrutura de concreto armado foi tecnicamente inovadora. Sua relevância histórica e arquitetônica faz evidenciar a importância de recuperação e restauração deste edifício histórico.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	R\$ 6.582.760,00	R\$ 923.000,00	

2015010632820
Ailton Maldonado - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB
fl. 62
08/06/2015

Tendal da Lapa

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Lapa, Lapa		10,0%


ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Radequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
-----------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA


Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

201501063282


11.63
08/06/2015

ANDAMENTO QUALITATIVO

Elaboração do projeto básico de requalificação do equipamento, pacote de reforma da instalação elétrica e reforma dos banheiros.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

201501068282

16/06/2015

Casa do Bandeirante

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	CONCLUÍDO
Equipamentos readequados	Butantã	Butantã	100,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Radequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
-----------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA

201501063282

08/06/2015
R.65
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

ANDAMENTO QUALITATIVO

Intervenção paisagística e recuperação do Rancho que abriga o Moinho do conjunto histórico da Casa do Bandeirante que representa um dos exemplares típicos das habitações rurais paulistas construídas entre os séculos XVII e XVIII em vasta área periférica ao núcleo urbano primitivo localizadas predominantemente junto à bacia de dois rios Tietê e o seu afluente Pinheiros.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	R\$ 1.003.538,00	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063882

11.60
08/06/2015

Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Centro Cultural da Juventude

TIPO	SUBPREFEITURA	DISTRITO	EM ANDAMENTO
Equipamentos readequados	Casa Verde/Cachoeirinha		25,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de Radequação (10%)	Garantia da fonte de financiamento (10%)	Licitação da obra (10%)	Obras de readequação (45%)	Implantação de estrutura (25%)
-----------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

FASE NÃO INICIADA FASE EM ANDAMENTO FASE CONCLUÍDA

201501063282

Pl. 67
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAR


ANDAMENTO QUALITATIVO

Reforma e requalificação predial, das instalações elétricas, de segurança e do acesso principal, a fim de manter e aprimorar as condições adequadas e seguras de funcionamento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	R\$ 117.421,00	

201501003282


Airon Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB
11.08
08/06/2015

Edifício Ramos de Azevedo

TIPO

Equipamentos
readequados

SUBPREFEITURA

Sé

DISTRITO

CONCLUÍDO

100,0%

ACOMPANHAMENTO DAS FASES

Projeto de
Readequação
(10%)

Garantia da
fonte de
financiamento
(10%)

Licitação da
obra (10%)

Obras de readequação (45%)

Implantação de estrutura (25%)

FASE NÃO INICIADA

FASE EM ANDAMENTO

FASE CONCLUÍDA

201501063282

A. M. G.
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB
08/06/2015


ANDAMENTO QUALITATIVO

Obras internas com o restauro do piso, forro, pintura do saguão, remoção do sistema de AC, novo sistema de ventilação e acessibilidade e dos sanitários do subsolo.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2013	2014 (Em revisão)	2015	2016
EXECUTADO	R\$ 1.003.546,00	Sem execução orçamentária no ano	Sem execução orçamentária no ano	

201501063282


Ailton Matrangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

11.70
08/06/2015

M E T A
28 Alcançar um calendário anual de programação cultural que inclua uma virada cultural no centro, duas descentralizadas e outros pequenos e médios eventos em diferentes temáticas e regiões da cidade

CULTURA

Secretaria Municipal de Cultura

Seguir
esta meta

CONCLUÍDA

100,0%

Criação do SP Cultura: plataforma livre, gratuita e colaborativa de mapeamento sobre o cenário cultural paulistano para conhecer as opções culturais que a cidade oferece: shows musicais, espetáculos teatrais, sessões de cinema, saraus, entre outras. Além de conferir a agenda de eventos, é possível colaborar na gestão da cultura da cidade, a partir da criação de um perfil de agente cultural. Acesse: <http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/>

Alguns dos eventos realizados em 2014: Aniversário da cidade com 24h de shows e outras atividades culturais; Virada Cultural em maio com mais de mil atrações em todas as regiões da cidade; Mês da cultura independente; Carnaval de Rua; Carnaska; Dia do Circo; Semana do Hip Hop; Arraial de São Paulo; Mês das Crianças; Consciência Negra; 23: Arte de Rua; Mês do samba; SP na Rua e Inauguração da programação cultural do Clube Tietê.

Ailton Marangon - AGPF
Assessoria de Planejamento
SMC - GAP

04/06/2015
R. 11

201501063282

IDENTIDADE

OBJETIVO

Ampliar o acesso da população à cultura, por meio de equipamentos e ações, a partir da sua descentralização no território

ARTICULAÇÃO

Fortalecimento das centralidades locais e das redes de equipamentos públicos

TIPOS DE PROJETO

Novos órgãos ou estruturas administrativas

DEFINIÇÕES DOS TERMOS TÉCNICOS

Calendário de eventos culturais: sistematização de agendas periódicas ou fixas de festivais, bienais feiras, fóruns e encontros, abrangendo todo o território e todos os segmentos culturais. Evento cultural: Atividade cultural temporária com o objetivo de difundir manifestações, estimular a criatividade e expressões populares e artísticas, ou promover debates em torno do assunto. Evento cultural de pequeno porte: para até 300 pessoas. Evento cultural de médio porte: para até 4 mil pessoas. Evento cultural de grande porte: para mais de 4 mil pessoas.

201501063282

Pl. 42
08/06/2015
Ailton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
S.M.C. 012

ANDAMENTO QUANTITATIVO

Criação de Calendário Cultural anual da cidade
Concluída **Concluída**

CONSTRUÇÃO DE
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS E/OU DO
MODELO DE GESTÃO

APROVAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS E/OU DO
MODELO DE GESTÃO

Concluída

INFRAESTRUTURA E
EQUIPAMENTOS

ANDAMENTO QUALITATIVO

Alguns dos eventos realizados em 2013: Virada Cultural em maio com a participação de 4 milhões de pessoas e a Festa de São João no Vale do Anhangabaú e em mais 6 bairros com a participação de 1 milhão de pessoas; Festa de São João; 4 Quebradas Culturais; 2 Territórios Funk; Mês da Cultura Independente; Semana do Samba. Também em 2013, foram realizados 4 Quebradas Culturais entre os meses de novembro e dezembro; 2 Territórios Funk em junho com a participação de 150 mil pessoas; Mês da Cultura Independente em outubro, com um público estimado em 200 mil pessoas; Semana do Samba realizada em dezembro.


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Custo previsto da meta
R\$ 51.362.103,00

Executado (Em revisão)
R\$ 30.750.000,00

201501063252


Arrion Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB


08/06/2015



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Cultura

CÓPIA

Folha de informação nº 74

08/06/2015

Airton Marangon - AGPP
Assessoria de Planejamento
SMC - GAB

Do Processo nº. 2015-0.106.328-2

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo – Vereador Andrea Matarazzo

Assunto: RDS nº 416/2015 – construção, requalificação ou reforma de 16 equipamentos culturais – Meta 27;
RDS nº 417/2015 – calendário anual de programação cultural – Meta 28.

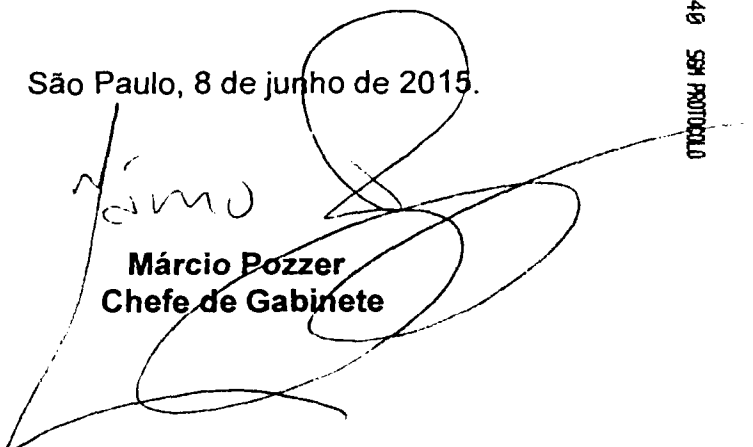
SGM/ATL- CHEFIA
Gabinete do Prefeito
Senhora Assessora Especial

Encaminhamos as informações atualizadas sobre as Metas 27 e 28 da SMC (fls. 08 - 73), salientando que as mesmas estão disponibilizadas com maiores detalhes, na Página do Programa de Metas 2013 – 2016.

<http://hsj2231.prodam/metas>

Atenciosamente

São Paulo, 8 de junho de 2015.


Márcio Pozzer
Chefe de Gabinete

12:29 09/06/2015 041340 SSM PROTOCOLADO

